

상대원2구역 주택재개발정비사업

공사도급계약(안) 4안 대조와 협상 경과

조합배포안 / DL안(변경 전, 2025. 11.) · DL안(변경 후, 2026. 8. 25.) / GS안

2026. 9. 5.

법무법인(유한) 지평

목 차

I	검토의 개요	4안 대조의 기준 · 협상 경과 · 사업 기재사항
II	협상 경과와 성과	1차 변경(8. 13.) · 2차 변경(8. 25.) · 확보한 조건
III	공사비와 물가변동	명목 단가 · 적용 지수 · 산정 기준월
IV	사업비 조달과 조합원 부담	사업촉진비 · 사업경비 · 이자율 · 분담금
V	조합·조합원의 책임과 위험	직접추심 · 사전구상권 · 해지책임 · 연대보증
VI	마감재 비교	3안 대조 · 항목별 우열 · 인근 사업장 비교
VII	종합 평가와 남은 과제	쟁점별 정리 · 총회 전 확인사항

I

검토의 개요

[I . 검토의 개요]

1. 하나의 기준(조합배포안)과 세 개의 안을 4분할로 비교함

일자	본 검토의 열	문서	작성자	지위
2025. 11.경	DL안 (변경 전)	공사도급(변경)계약서	DL이앤씨	당초 협의안. 54개조의 별도 체계
2026. 2.	조합배포안	공사도급계약서(안)	조합	공사계약조건 56개조. 모든 비교의 기준
2026. 8. 13.	(경과)	도급계약서 주요 수정 제안 내용	DL이앤씨	1차 변경안.
2026. 8. 25.	DL안 (변경 후)	공사도급(변경)계약서	DL이앤씨	2차 변경안. 조합배포안을 수용
2026. 3.	GS안	공사도급계약서(안) 및 제안서	GS건설	조합배포안 체계를 따름. 마감재 리스트 첨부

- 이하 모든 비교표는 조합배포안 · DL안(변경 전) · DL안(변경 후) · GS안의 네 개 열로 비교함.
- GS안은 조합배포안의 조문 체계를 그대로 따랐으나, DL당초 협의안은 별도의 체계로 작성되어 주제별로 비교함.
- DL안은 2026. 8. 13.과 2026. 8. 25. 두 차례 변경을 거쳐 불합리한 조항(또는 독소 조항)을 제거하고 조합배포안의 체계와 내용으로 변경하여 반영 함.

2. 조합배포안을 기준으로 DL안은 두 차례 변경됨

시점	주체	내용
2025. 11.경	DL이앤씨	당초 협의안 — 별도 체계 54개조 (평당 682만 원, 산정 기준월 2025. 8.)
2026. 2.	조합	공사도급계약서(안) 배포 — 이후 모든 협상의 기준
2026. 3.	GS건설	조합배포안 체계를 수용한 계약서(안) 및 마감재 리스트 제출 (평당 729만 원)
2026. 8. 13.	DL이앤씨	1차 변경안 — 조합 요구 9개 항목 수용(별도 항목 설명예정)
2026. 8. 21.	조합	2차 수정 요구안 제시 — 조합배포안 전문을 기준으로 재제시
2026. 8. 25.	DL이앤씨	2차 변경안 — 조합배포안 수용

- 조합이 조합 배포안을 기준으로 네 차례 수정을 요구하였고, DL이앤씨는 두 차례에 걸친 수정을 통해 조합배포안을 수용함.
 - 그 결과 2026. 8. 25. 기준 DL안은 조합배포안을 수용하여 반영함.

[I. 검토의 개요]

JIPYONG 법무법인[유] 지평

3. 다만 사업 기본사항에서 아직 일치하지 않는 부분이 있음

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
사업부지 면적	공란 (000,000.0㎡)	177,061.9㎡ (53,561.22평)	177,061.9㎡ (53,561.22평)	242,045.1㎡ (73,218.64평)
연면적 (승강기 면적 제외)	공란	709,328.8729㎡ (계약서(안) 기재)	873,937.678㎡ 사업시행인가 신청 기준	871,458.4984㎡ 사업시행인가 기준
조합원 수	2,388세대 (보류지 12세대 포함)	2,388세대	2,388세대	2,388세대
공사기간	공란 (OO개월)	50개월 (실착공 조건 4개)	52개월	52개월
지질조건 기준	"갑"의 지질조사 보고서 (일자 공란)	"갑"이 실시한 지질조사 보고서	"갑"이 실시한 지질조사 보고서	"갑"의 지질조사 보고서 (일자 공란)

- 공사계약금액: '평당 단가 × 연면적'으로 산정 → 연면적 기준을 사업시행인가 기준으로 통일할 필요가 있음.
- 사업부지 면적 차이{64,983.2㎡(19,657평)} : 패널 웅벽공사의 포함 여부에서 비롯 (GS안 : 2BL 웅벽공사비가 공사비에 포함, DL안 : 2BL 웅벽공사비 확인 필요)
→ 정확한 공사비 비교를 위해 DL의 2BL 웅벽공사비 산출 후 DL공사비에 더해야 GS안과 비교가 가능함.
- 확정필요: 계약서상 사업부지 면적·연면적·지질조사 보고서 일자를 계약 체결 전에 확정하여야 함.
- 철거공사비: 이미 완료된 상태로 DL 공사비 안에 포함되어 있는 것으로 회의를 확인해줌. 다만, 산출내역서에 별도 항목으로 기재되어 있지 않고 다른 항목에 포함되어 있는 것으로 보임.
→ 이 경우 공사량 증감시 단가 산출이 불가능하며, 다른 항목에 포함된 철거 공사비로 품목 단가가 상승할 수 있는 불이익이 발생할 수 있어 철거 공사비 산출내역을 요청함.

II

협상 경과와 성과

[Ⅱ. 협상 경과와 성과]

1. DL과 협상

- 가. 2025. 7 ~ 2025. 11. 공사도급계약 협상
- 나. 2026. 2. 조합배포안(도급계약서) 배포 및 수령
- 다. 2026. 8. 13. 조합배포안(도급계약서) 미수용 / 9개 항목 수용
- 라. 2026. 8. 21. 조합과 공사도급계약 협의 / 조합배포안 수용의사
- 마. 2026. 8. 25. 조합배포안(도급계약서) 수용

2. GS와 협상

- 가. 2026. 2. 조합배포안(도급계약서) 작성 및 시공사 입찰 진행
- 나. 2026. 2. GS 사업제안서 제출
- 다. 2026. 3. 조합배포안(도급계약서) 수용

[표. 협상 경과와 성과]

1. 1차 변경(2026. 8. 13.) — DL이 조합 요구 → 9개 항목 수용

쟁점 (당시 조문)	DL안 변경 전 (2025. 11.)	DL 1차 변경안 (2026. 8. 13.)
공사계약금액 (제7조)	682만 원/평 (공사비 산정 기준월 2025. 8.)	699만 원/평(기준월 2026. 12.) 또는 682만 원/평(기준월 2026. 6.) 중 조합이 선택
물가변동 (제8조)	실착공 후 4%까지는 시공자 부담, 4% 초과분은 <u>건설물가지수를 반영하여 상승률만큼 공사비 증액 변경</u>	실착공 이후 물가인상에 따른 공사비 변동이 없는 확정공사비
계약이행보증 (제10조)	조합 임원 전원 연대보증	조합 임원 전원 연대보증 문구 삭제 수용 의견에 따라 반영 필요
사업경비 (제15조)	사업촉진비 없음 시공자 직접대여금 없음	사업촉진비 2,000억 원 책임 조달 시공자 사업비 500억 원 직접 대여 (사업비 증액에 따른 HUG 사업비 증액 보증이 이루어질 때까지 약 1,100억 원의 추가 사업비가 필요한 상황으로, 부족분에 대한 구체적인 조달 방안은 추가 협의가 필요함.)
사업경비 대여중지 (제19조)	임의집행·관리처분 요구 미이행 시 대여 중지, 지급중지 사유 발생 시 공사 중단 가능	제2항·제4항 삭제
관리처분계획 (제20조)	공사비 부족시 관리처분변경계획 총회 미진행에 대한 사업비 대여중단, 공사 중단 입주제한 등 강제 규정	제2항(사업비 대여중단/공사중단) 수정 제3항(입주제한) 삭제
조합원 분양 (제22조)	계약금 10%, 중도금 40%, 잔금 50%	입주 시 100% 또는 입주 1년 후 100% 납부
일반분양 (제23조)	리서치 업체 산정가로 일반분양가 결정 실착공일로부터 30일 이내 일반분양 승인	조합·시공자가 합의하여 결정(리서치 조항 삭제) 실착공일로부터 8개월 이내 일반분양 승인
특약 · 직발주 (제53조·제54조)	GS건설 손해배상 관련 문구 없음 조합 직발주 공사로 공사수행 지장시 시공사가 직접 또는 제3자로 하여금 공사수행 가능(제3항) 제4항(직발주공사로인한 손해배상) 존치	GS건설 손해배상액을 시공자가 부담하는 문구 반영 직발주 관련 제3항 삭제

[Ⅱ. 협상 경과와 성과]

2. 2차 변경(2026. 8. 25.) — DL이 조합배포안 수용

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
조문 체계	56개조	자체 체계 54개조	56개조 (조합배포안 그대로)	56개조
별첨서류	공사계약조건, 마감재리스트	공사계약조건, 마감재리스트, 브랜드준수확약서, 부속합의서	공사계약조건, 마감재리스트	공사계약조건, 마감재리스트
물가변동 적용 지수	소비자물가 인상률 (착공시점 이후 물가변동 없음)	건설공사비지수 (착공이후에도 물가변동 적용)	소비자물가 인상률 (착공시점 이후 물가변동 없음)	소비자물가 인상률 (착공시점 이후 물가변동 없음)
공사비 증액 사유	4개 사유	10개 호 (포괄적사유 3개 포함)	4개 사유	4개 사유
공사기간 연장 사유	6개 사유	15개 사유	6개 사유	6개 사유
공사비 미납시 조합원에 대한 직접 추심	규정 없음	있음	규정 없음	규정 없음
사전구상권 · 공정증서	규정 없음	있음	규정 없음	규정 없음
공사도급계약 해지 시 손해배상	일반 손해배상	공사이익 + 별도 손해	일반 손해배상 (제36조 제4항)	일반 손해배상
계약이행보증	계약 시 100분의 O (공란)	착공 이후 시공보증서 (금액 미기재)	계약 시 5% · 시공사 귀책 해지 시 조합 귀속	계약 시 5% · 시공사 귀책 해지 시 조합 귀속

- DL안은 공사비 증액 및 공사기간 연장 사유가 폭넓게 규정되어 있었으나, 2차 변경을 통해 조정됨에 따라 DL안과 조합 배포안(GS안) 간 계약조건의 차이는 대부분 조정됨.
 - 남아 있는 주요 차이는 공사비 단가·산정 기준월, 사업부지 면적, 그리고 마감재입니다.

[II. 협상 경과와 성과]

3. 조합원 개인에게 직접 미치던 위험 조항 삭제

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
공사비 미납시 조합원에 대한 직접 채권청구·추심	규정 없음	정산채무에 대하여 조합을 대위하여 조합원 개인에게 직접 청구·추심 (구 제33조 제5항)	규정 없음	규정 없음
사전구상권 특약	규정 없음	민법 제442조의 제한을 배제 (구 제42조 제3항)	규정 없음	규정 없음
집행력 있는 공정증서	규정 없음	직접대여금 50억 원마다 공증 (구 제42조 제2항)	규정 없음	규정 없음
채권채무확인서 징구	규정 없음	매 반기 공문 제공 (소멸시효 갱신 목적)	규정 없음	규정 없음
조합 명의 재산 제1순위 근저당	규정 없음	요구 가능 (구 제15조 제8항)	규정 없음	규정 없음
해지 시 손해배상 범위	일반 손해배상	공사이익 + 별도의 손해 (구 제33조 제4항)	일반 손해배상 (제36조 제4항)	일반 손해배상

- 위 조항들은 사업이 순조롭지 않을 때 조합원 개인의 재산에 직접 미치는 위험으로, 당초 DL안에서 가장 무거운 부담이었음.
- 2026. 8. 25. DL이 조합배포안을 수용함으로써 위 조항은 모두 삭제되었으며, 이는 조합배포안·GS안과 같은 상태임.

[표. 협상 경과와 성과]

JIPYONG 법무법인[유] 지평

4. 공사비가 늘어날 수 있는 사유가 줄어듦

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
공사비 증액 사유	4개 사유 (공사기간연장, 물가변동 조합요구, 법률변경 등)	10개 사유 (4개 사유 포함 기타 시공자 책임 아닌 포괄 사유 3개 포함)	4개 사유 (제34조 제1항)	4개 사유
공사기간 연장 사유	6개 사유	15개 사유	6개 사유 (제32조 제1항)	6개 사유
실착공일 결정 방법	착공도서 제공 후 60일 이내 협의	관리처분변경총회 등 4개 조건 중 족 후 시공자가 통지한 날	착공도서 제공 후 60일 이내 협의 (제10조 제2항)	착공도서 제공 후 60일 이내 협의
공사비 산출내역서	실시설계 수령 후 3개월 이내 제출	규정 없음 (제출의무 없음)	실시설계 수령 후 3개월 이내 제출 (제7조 제6항)	실시설계 수령 후 3개월 이내 제출
설계변경 단가 산정 기준	3단계 기준 명시	규정 없음	3단계 기준 명시 (제34조 제3항)	3단계 기준 명시
지체상금 면제	연장 사유 해당일수 면제	규정 없음	연장 사유 해당일수 면제 (제39조 제3항)	연장 사유 해당일수 면제
조합 부담 비용 항목	15개	19개	15개 (제6조 제3항)	15개

- 공사비 증액· 공사기간 연장 사유의 수는 곧 공사비 증액 사유에 해당 됨.
- 당초 DL안의 포괄적인 공사비 증액 사유(예: "그 외 을의 책임이 아닌 사유")는 삭제됨.
- 산출내역서 제출 의무 및 산출내역서를 설계변경 단가 산정 기준으로 규정. → 향후 설계변경 시 단가 산정의 기준이 설정되어 분쟁을 예방할 수 있는 기틀을 마련.

[II. 협상 경과와 성과]

5. 분양 · 품질 · 입주 조건도 조합배포안 수준으로 회복됨

JIPYONG 법무법인[유] 지평

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
미분양 할인 개시	최초분양개시 12개월 후 매월 2% 감액	최초분양개시 3개월 후 매월 2% 감액	최초분양개시 12개월 후 매월 2% (제25조 제4항)	최초분양개시 12개월 후 매월 2% 감액
분양촉진비 사용권 위임	일반분양 개시 9개월 후	청약경쟁률·계약률 미달 시 즉시	일반분양 개시 9개월 후 (제25조 제4항)	일반분양 개시 9개월 후
미분양 추가비용	규정 없음	추가 금융비용·분양경비를 조합이 별도 부담	규정 없음	규정 없음
입주지정기간	90일	60일	90일 (제48조 제1항)	90일
하자보수 범위·기간	관계법령에 규정된 내용	관계법령 범위 안에서 협의하여 결정	관계법령에 규정된 내용 (제49조 제1항)	관계법령에 규정된 내용
공사감독원 제도	있음	규정 없음	있음 (제29조)	있음
수입금 예치이자 · 위약금	조합 귀속	시공사 귀속	조합 귀속 (제41조 제3항)	조합 귀속
상환 총당 순서	공사비→유이자→무이자	공사비→무이자→유이자	공사비→유이자→무이자 (제41조 제1항)	공사비→유이자→무이자

- 미분양 할인이 9개월 늦게 시작되고, 미분양에 따른 추가비용의 조합 부담 조항이 삭제됨으로써 조합의 부담이 낮아짐.
 - 수입금, 위약금 조합귀속으로 변경하여 조합의 재산이 증가됨.
 - 조합에게 하수급인 변경 요구권을 부여함으로써 조합의 시공사 통제권 강화됨(제31조 제3항).

[Ⅱ. 협상 경과와 성과]

6. DL의 1차 변경으로 얻은 추가 조건은 2차 변경안에도 그대로 유지되어 조합에게 유리함

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
사업촉진비	규정 없음	없음	2,000억 원 한도 책임 조달·대여 (제17조 제1항 제37호, 제2항)	1,000억 원
HUG보증 증액 전 추가 대여	규정 없음	없음	500억 원 한도 대여, 증액 완료 즉시 우선 상환 (제17조 제1항 단서)	600억 원 (입찰보증금 300억 · 착공준비금 300억)
GS건설 대여 사업비 승계	규정 없음	—	사업경비 항목에 포함 (제17조 제1항 제38호)	—
손해배상 부담	규정 없음	규정 없음	가처분 결정 시까지 확정된 금원을 시공자가 부담 (제55조 제2항)	200억 한도 시공사가 부담
조합원 분담금 납부	계약 10% · 중도 40% · 잔금 50%	계약 10% · 중도 40% · 잔금 50%	입주 시 100% 또는 입주 1년 후 100% (제24조 제3항·제4항)	수요자 금융조달 원칙, 입주 시 100%
조합운영비	공란	월 5,800만 원 총 75억 800만 원	월 5,800만 원 · 총 75억 800만 원 (제19조 제1항)	월 5,800만 원 총 36억 원

- 사업촉진비 2,000억 원 다주택자 조합원의 분담금 재원 확보에 도움이 됨.
 - 추가 직접 대여금액(500억 원)을 제시하였으나, 현재 사업비 증액에 따른 HUG 사업비 증액 보증이 이루어질 때까지 약 1,100억 원의 추가 사업비가 필요한 상황으로, 사업비 부족분에 대한 구체적인 조달 방안은 추가 협의가 필요함.
 - 다만 사업촉진비는 유이자 대여이므로(제17조 제3항), 결국 조합원이 이자와 함께 상환하는 자금이라는 점에서 사업추진에는 장점이나, 추후 상환을 위해 조합원 부담이 될 수 있음.

Ⅲ

공사비와 물가변동

[Ⅲ. 공사비와 물가변동]

1. 명목 공사비는 DL안이 GS안보다 낮은 수준임

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
평당 단가	공란	682만 원 (착공 후 건설공사비 지수 반영) (계약서(안)에는 금액 공란)	699만 원 또는 682만 원 (조합이 선택)	729만 원
공사비 산정 기준월	입찰일	2025. 8.	2026. 12. 또는 2026. 6.	2026. 12.
연면적 (승강기 제외)	공란	709,328.8729m ²	873,937.678m ² (264,366.148평)	871,458.4984m ² (263,616.196평)
공사비 총액 (VAT 별도)	—	금액 공란	1조 8,479억 원 또는 1조 8,030억 원	1조 9,217억 원
GS안 대비 차액	—	—	△739억 원 (△3.8%) 또는 △1,188억 원 (△6.2%)	—
조합원 1세대당 환산	—	—	△3,093만 원 또는 △4,974만 원	—

- DL안: 두 가지 산정 기준월 중 조합이 선택가능토록 제시. 2026. 6.은 이미 경과하였으므로, 실제 비교는 2026. 12. 기준(699만 원)으로 하는 것이 타당함.
- 다만, GS안과 DL안은 단순 평당 단가만으로는 비교할 수 없음.
 - DL안은 2BL 옹벽공사 비용이 사업부지에서 제외되어 있고, 도급계약서 및 산출내역서의 공사금액 및 내역이 일치하지 않아 보완 필요.
 - DL안 마감재는 GS안 마감재 보다 낮은 수준임(마감재 부분에서 별도 비교).
 - 철거공사비가 산출내역서에 별도 기재되어 있지 않아 다른 항목에 포함된 것으로 보임. 이로 인해 설계변경 시 타 품목 단가 상승 불이익이 발생할 수 있어 철거공사 산출내역서 제출필요.
- GS안 특화공사비 산출서에 따르면 GS의 마감재·조경·외관 특화분만 평당 약 85만 원(총 2,250억 원)으로 산정되어 있음.
- GS안 일반분양 및 임대아파트 발코니 옵션 매출(약 350억원)을 조합에 귀속시켜 사업추진 여유를 부여함.
- 결론적으로 GS안 729만 원과 DL안 699만 원의 차이 30만 원은 마감재 수준(약 85만 원) 차이만으로도 설명될 수 있는 범위임.

[Ⅲ. 공사비와 물가변동]

2. 적용 지수가 소비자물가지수로 바뀌어 증액 위험 완화

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
적용 지수	통계청 소비자물가 인상률	한국건설기술연구원 건설공사비지수	통계청 소비자물가 인상률	통계청 소비자물가 인상률
최근 연간 상승률	2.8% (2026. 7.)	5.1% (2026. 5.)	2.8% (2026. 7.)	2.8% (2026. 7.)
조정 기간	입찰일 ~ 실착공일	산정 기준일 ~ 실착공일	산정 기준일(2026. 12) ~ 실착공일	산정 기준일(2026. 12) ~ 실착공일
실착공 이후 조정	없음 (확정공사비)	4% 초과분은 도급 변경	없음 (확정공사비)	없음 (확정공사비)
증액 요구 시 의무	계약금액 조정 근거 제출	공사비 조정 근거 제출	계약금액 조정 근거 제출	계약금액 조정 근거 제출
근거 조문	제9조 제1항	구 제8조 제1항	제9조 제1항	제9조 제1항

소비자물가지수 (2026. 7.)		2.8% (변경 후 적용)
건설공사비지수 (2026. 5.)		5.1% (변경 전 적용)

- 소비자물가지수는 가계 소비재 전반의 가격을, 건설공사비지수는 건설에 투입되는 자재·노무비를 기준으로 측정함. → 같은 기간에도 상승률이 크게 달라짐.
- 건설공사비지수는 2026. 5. 경 137.67을 기록하며 연속 최고치를 경신하였고, 소비자물가지수보다 약 1.8배 빠르게 오르고 있음.
- 당초 DL안은 착공이 늦어질수록 공사비가 빠르게 늘어나는 구조였음. → 변경 후 DL안은 조합배포안·GS안과 같은 소비자물가 인상률을 적용함.

[Ⅲ. 공사비와 물가변동]

3. 남은 변수 : 산정 기준월, 면적, 그리고 공사비에 포함되지 않은 항목

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
공사비 산정 기준월	입찰일	2025. 8.	2026. 12. 또는 2026. 6. (조합이 선택)	2026. 12.
연면적 기준	공란	계약서(안) 기재 709,328.8729㎡	사업시행인가 신청 기준	사업시행인가 기준
패널 웅벽공사 부담	1~3호 조합 부담 (제6조 제3항 제15호)	조합 부담	1~3호 조합 부담 (제6조 제3항 제15호) 경계부 2BL 시공자 부담 여부 확인 필요	1~3호 조합 부담 + 경계부 2BL은 시공자 부담 (제6조 제2항 제22호)
발코니 확장 부가가치세	준공 시 청구	해당 문구 없음	조합원 발코니 확장 및 발코니창호공사 및 조합원특별제공품목, 분양대행비에 대한 부가가치세는 준공시 청구하기로 한다는 문구 삭제 (확인 필요)	준공 시 청구 (조합배포안과 동일)
마감재 기준	시공자 제출 제안서· 마감재 리스트에 위임	구체적 자재·규격 미기재	마감재 리스트 14개 항목 (등급 표현) → 실제항목 알기어려움	마감재 리스트 (실별·품목별 특정)

- 계약 체결 전에 ① 공사비 산정 기준월 / ② 연면적 기준 / ③ 웅벽공사 비용의 귀속 / ④ 발코니 확장 부가가치세 청구 시기 / ⑤ 철거공사비 산출내역서 제출 등을 확정하여야 함.
 - 위 5 가지는 모두 계약서 문언으로 정리할 수 있는 사항이며, 지금 정리하지 않으면 착공 이후 분쟁의 대상이 될 수 있음.
 - 마감재는 VI장에서 별도로 검토함.

[Ⅲ. 공사비와 물가변동]

4. 소결 — 제시된 공사비는 DL안이 명목상 적으나, 마감재 수준 등을 고려해야 함.

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
평당 단가	공란	682만 원	699만 원 또는 682만 원 (실질적으로 699만원 기준)	729만 원
실착공 후 물가조정	없음	4% 초과분 물가변동 대상	없음	없음
기준일~실착공 적용 지수	소비자물가 (연 2.8%)	건설공사비지수 (연 5.1%)	소비자물가 (연 2.8%)	소비자물가 (연 2.8%)
공사비 증액 사유	4개 사유	10개 사유	4개 사유	4개 사유
공기 연장 사유	6개 사유	15개 사유	6개 사유	6개 사유
산출내역서 제출 의무	있음	없음	있음	있음
설계변경 단가 산정 기준	3단계 명시	없음	3단계 명시	3단계 명시
마감재 수준	리스트 없음 (시공자 제출에 위임)	구체적 기재 부족	리스트 제출 (GS 대비 낮음)	특화 반영 (평당 약 85만 원)

- 당초 DL안의 다수의 공사비 증액 사유는 조합배포안 수용으로 조합배포안·GS안과 같은 수준으로 정리됨.
 - 공사비 비교의 핵심은 단가 차이(30만 원/평)와 마감재 수준 차이의 크기를 어떻게 볼 것인지로 볼 수 있음.

IV

사업비 조달과 조합원 부담

[IV. 사업비 조달과 조합원 부담]

JIPYONG 법무법인[유] 지평

1. 사업추진비 2,000억 원은 DL안이 유리하며, 500억 원 추가 대여 관련 필수 사업비 부족분에 대하여 확인 필요

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
사업추진비	규정 없음	없음	2,000억 원 한도 책임 조달·대여 (금융기관 차입·자기자금 등 선택) 제17조 제1항 제37호, 제2항	1,000억 원
HUG보증 증액 전 추가 대여	규정 없음	없음	500억 원 한도 대여 증액 완료 즉시 우선 상환 제17조 제1항 단서	600억 원 (입찰보증금 300억 · 착공준비금 300억)
GS건설 대여 사업비	규정 없음	—	사업경비 항목에 포함하여 승계 제17조 제1항 제38호	—
대여 자금의 성격	유이자	—	유이자 (제17조 제3항)	유이자

- 사업추진비 : **다주택자 조합원의 분담금 납부 재원 확보**라는 관점에서는 DL안이 유리함.
- 다만 사업추진비는 무이자자가 아니라 유이자 대여이므로, 결국 조합원이 이자와 함께 상환하는 자금이라는 점에서 사업추진을 위해 조금 더 유리한 조건임.
- DL안의 강점은 조합이 실제로 그 **자금을 필요로 하는 경우에만 의미**가 있음.
- 확인 필요: 사업추진비의 대여조건(이자율·상환시기)은 "**별도로 정하는 대여조건**"에 맡겨져 있으므로, **계약 체결 전에 조건을 서면으로 확정**할 필요가 있음.
- HUG 사업비 증액보증 완료 전 약 1,100억 원의 사업비가 필요하나, DL 제안(직접대여 500억 원)만으로는 부족하여 약 600억 원의 추가 사업비 조달방안에 대한 구체적인 방안 확인 필요

[IV. 사업비 조달과 조합원 부담]

2. 사업경비 · 조합운영비 · 이자 조건은 조합배포안 수준으로 동일해짐

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
사업경비 총 한도	5,605억 원	5,605억 원	5,605억 원	5,605억 원
무이자 대여 한도	1,493억 원	1,493억 원	1,493억 원 (2015년~준공 = 한도 소진 됨)	1,538억 원 (2026년~조합 청산까지)
유이자 대여 한도	4,112억 원	4,112억 원	4,112억 원	4,067억 원
무이자 대여 대상	제1호~제31호	제1호~제31호	제1호~제31호	제1호~제31호
조합운영비 (월 / 총한도)	공란	5,800만 원 / 75억 800만 원	5,800만 원 / 75억 800만 원	5,800만 원 / 36억 원
대여중지 최고기간	2개월	30일	2개월 (제21조 제1항)	2개월
대여중지 사유	2개	3개 (포괄 사유 포함)	2개 (제21조 제1항)	2개
대여 이자율	협의 선정 금융기관 대출이자율	연 5.9% 고정	협의 선정 금융기관 대출이자율 (제20조)	연 CD + 4%
연체료율	협의 선정 금융기관 연체료율	연 13% 고정	협의 선정 금융기관 연체료율 (제20조)	연 CD + 9%

- 당초 DL안은 '30일 최고 · 포괄적 대여중지 사유 · 연 5.9% 고정금리'는 모두 조합배포안 문언으로 대체되어 GS안과 동일해 짐.
- 무이자 대여 한도의 경우, DL안은 기존 한도가 이미 소진된 반면 GS안은 2026년부터 총 1,538억 원의 무이자 대여 한도를 지원하므로 GS안이 조합에 유리함.
- 조합운영비 총한도는 DL안이 39억 원 많지만, 월별 운영비는 동일하고 적용 시점의 차이에 따른 것이므로 실질적인 조건은 동등한 것으로 판단됨.

[IV. 사업비 조달과 조합원 부담]

3. 조합원 분담금 납부시기

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
계약금	부담금의 10%	부담금의 10%	부담금의 10%	부담금의 10%
중도금	10% × 4회	10% × 4회	10% × 3회	10% × 3회
잔금	50%	50%	60%	60%
실제 납부 방법	규정 없음	규정 없음	입주 시 100% 또는 입주 1년 후 100% (제24조 제4항 제2호)	수요자 금융조달 원칙, 입주 시 100%
1년 후 납부의 조건	—	—	조합원별 근저당 등 담보 설정 후 지급보증을 통한 조합(또는 조합원) 명의 대출 (비용은 조합원 부담)	—
조합의 계약률 의무	없음	정당계약 30일 내 90%	없음	없음
환급금 지급 시기	사업완료 후	입주지정기간 만료일	사업완료 후 (제24조 제4항 제1호)	사업완료 후

· DL안의 입주 1년 유예는 조합원에게 실질적 이익이 될 수 있으나, 조합(또는 조합원) 명의 대출을 전제로 하므로 조합(조합원)의 부담으로 작용함.

· 제24조 제4항 제2호는 "향후 조달 시점의 정부정책, 관련 법령 등에 따라 조달 여부 및 금리 한도가 달라질 수 있다"고 정하고 있어, 확정된 약속으로 보기는 어려움.

[IV. 사업비 조달과 조합원 부담]

4. 소결 — 재원의 크기는 DL안, 조건의 안정성은 대등해짐

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
사업촉진비 등 추가 자원	규정 없음	없음	2,000억 + 500억 원	1,000억 원 + 600억 원
무이자 대여 한도	1,493억 원	1,493억 원	1,493억 원(한도 소진)	1,538억 원 (26년~청산시)
조합운영비 총한도	공란	75억 원	75억 원	36억 원
대여 이자율	협의 금융기관 금리	연 5.9% 고정	협의 금융기관 금리	CD + 4%
연체료율	협의 금융기관 연체율	연 13% 고정	협의 금융기관 연체율	CD + 9%
대여중지 요건	2개월 최고, 사유 2개	30일 최고, 사유 3개	2개월 최고, 사유 2개	2개월 최고, 사유 2개
상환 총당 순서	공사비→유이자→무이자	공사비→무이자→유이자	공사비→유이자→무이자	공사비→유이자→무이자
수입금 예치이자·위약금	조합 귀속	시공사 귀속	조합 귀속	조합 귀속
조합원 분담금 납부	계약 10%-중도 40%-잔금 50%	계약 10%-중도 40%-잔금 50%	입주 시 또는 1년 후 100%	입주 시 100%

- 사업비 조달 조건에서 당초 DL안이 불리하였으나, 조합배포안을 수용함으로써 기타 조건을 제외한 도급계약서 문구는 대등해 짐.
 - 추가 자원(사업촉진비·추가 대여)과 입주 1년 후 분담금 유예는 DL안이 유리하나, 무이자 대여한도는 GS안이 유리함.
 - 대여이자율은 GS안은 명확하나, DL안은 향후 협상 조건에 따라 달라질 수 있다는 점에서 불명확함.

V

조합·조합원의 책임과 위험

1. 조합원에 대한 직접 추심 조항이 삭제됨

DL안 변경 전 — 구 제33조 제5항 (계약의 해제 및 해지)

""갑'이 '을'에게 지급하여야 할 정산채무에 대해 '을'은 '갑'을 대위하여 조합원 종전자산 출자비율에 의거 '갑'의 조합원에게 직접 채권청구 및 추심행위를 할 수 있으며, 원활한 이행을 위해 조합정관, 관리처분계획 ..."

DL안 변경 후 — 제36조 (계약의 해제 및 해지)

조합원에 대한 직접 채권청구·추심 조항 삭제함
제36조 제3항은 계약이 해제·해지된 경우 조합이 정산을 실시하도록 정하고 있을 뿐이며, 조합원 개인에 대한 청구 근거는 두고 있지 않습니다. 조합배포안·GS안도 같습니다.

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
조합원에 대한 직접 추심	규정 없음	있음 (구 제33조 제5항)	규정 없음	규정 없음
조합원 채무 미납 시 담보	채무금액 120% 근저당 또는 관리처분신탁	동일 취지	동일 (제45조 제1항)	동일 (제45조 제1항)

- 조합은 법인이므로, 원칙적으로 조합의 채무가 조합원 개인에게 당연히 미치지 않음.
- 당초 DL안은 이 조항을 통해 그 원칙을 뒤집어, 조합원 개인의 재산에 대하여 직접 집행할 수 있는 근거를 만들어 두었음.
- DL안은 조합배포안 수용 후 DL안에는 해당 조항이 삭제되었으며, 조합배포안·GS안과 같음.
- 다만 조합원이 부담금 등을 미납한 경우의 일반적 채권보전 조항(제45조)은 모두 동일함.

[V. 조합·조합원의 책임과 위험]

JIPYONG 법무법인[유] 지평

2. 사전구상권 특약과 집행력 있는 공정증서 삭제

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
사전구상권 특약	규정 없음	민법 제442조의 제한에도 불구하고 사전구상권 행사 가능 (구 제42조 제3항)	규정 없음	규정 없음
집행력 있는 공정증서	규정 없음	직접대여금 50억 원마다 집행력 있는 정본으로 공증 (구 제42조 제2항)	규정 없음	규정 없음
채권채무확인서	규정 없음	매 반기(3월·9월) 공문 제공 (소멸시효 갱신 목적)	규정 없음	규정 없음
조합 명의 재산 근저당	규정 없음	현금청산 등으로 발생한 조합 명의 재산에 제1순위 근저당 요구 가능 (구 제15조 제8항)	규정 없음	규정 없음

- 민법 제442조는 수탁보증인의 사전구상권을 일정한 경우로만 인정하는데 비해, 당초 DL안은 그 제한을 배제하는 효과를 가지도록 규정함.
- 집행력 있는 공정증서는 재판 절차 없이 곧바로 강제집행할 수 있는 집행권원을 미리 만들어 두는 조항으로 조합원에게 대단히 불리함.
- 위 조항들은 조합과 조합원의 채무를 강하게 담보하기 위한 장치로, 조합배포안과 GS안에는 없던 조항임.
- 변경 후 DL안에는 일반적인 채권보전 조항(제45조)만 남아 있으며, 이는 조합배포안·GS안과 같은 수준임.

[V. 조합·조합원의 책임과 위험]

3. 해지 시 배상 범위 정리 및 계약이행보증 확보됨

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
해지 시 손해배상	손해가 발생한 경우 상대방에게 배상 청구	조합 귀책 시 시공자의 공사이익 + 별도의 손해까지 배상	손해가 발생한 경우 상대방에게 배상 청구 (제36조 제4항)	손해가 발생한 경우 상대방에게 배상 청구
조합의 해지 사유	7개	5개	7개	7개
시공자의 해지 사유	3개	7개	3개	3개
조합의 해지 기준 (지체상금 도달 기준)	지체상금이 계약금액의 10%	지체상금이계약금액의 5%	지체상금이 계약금액의 10%	지체상금이 계약금액의 10%
계약이행보증 시기·금액	계약 체결 시 100분의 〇 (공란)	착공 이후 시공보증서 (금액 명시 없음)	계약 체결 시 5% (제11조 제1항)	계약 체결 시 5%
시공사 귀책 해지 시 보증금	조합에 귀속	규정 없음	조합에 귀속 (제11조 제4항)	조합에 귀속
계약금액 증액 시 보증	추가 납부 의무	규정 없음	추가 납부 의무 (제11조 제3항)	추가 납부 의무

- 계약해지시 손해배상 : 당초 DL안은 "공사이익 + 별도의 손해" 배상은 이행이익 전부를 배상하라는 취지로 규정되어 있어 배상규모가 대단히 컸음.
- 손해배상 규모를 일반적인 계약서 수준으로 변경하여 조합배포안과 GS안과 동일해짐.
- 조합이 해지할 수 있는 지체상금 규모가 5%에서 10%로 높아졌으나, 실제 시공사 귀책에 의한 계약해지가 거의 없다는 점 및 일반적인 도급계약 관례에 따른다는 점에서 큰 의미는 없음.

4. 조합 임원 연대보증 조항 삭제됨

조합배포안 · GS안 · DL안(변경 후) 제11조 제6항 (계약이행보증)

⑥ "갑"의 정관에 따라 선출된 "갑"의 임원은 이 계약을 성실히 준수할 의무를 지며, 본 공사도급계약에 따라 "을"이 "갑"에게 부담하는 채무에 대하여 "갑"의 임원은 "갑"과 연대하여 책임을 진다.

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
조합 임원 연대보증	제11조 제6항·제7항 도급계약상 채무로 한정	구 제10조 제3항 조합이 부담하는 제반 일체의 채무	제11조 제6항·제7항 존치 도급계약상 채무로 한정	제11조 제6항·제7항 도급계약상 채무로 한정
1차 변경안(2026. 8. 13.)에서의 처리	—	—	조합의 요청에 따라 DL이앤씨가 조합 임원연대보증 조항의 삭제를 수용하였 으므로, 해당 문구는 삭제가 필요함.	—

· 조합의 요청에 따라 DL이앤씨가 조합임원연대보증 조항의 삭제를 수용하였으므로, 해당 문구는 삭제가 필요함.

5. 소결 — 책임부담 규정 삭제로 DL안과 GS안 대등해짐

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
시공자의 조합원 직접 추심	없음	있음	없음	없음
사전구상권 특약	없음	있음	없음	없음
집행력 있는 공정증서	없음	있음	없음	없음
조합 명의 재산 근저당	없음	있음	없음	없음
해지 시 손해배상 범위	일반 규정	공사이익 + 별도 손해	일반 규정	일반 규정
시공자의 해지 사유 수	3개	7개	3개	3개
계약이행보증	계약 시 (금액 공란)·귀속	착공 후 시공보증서	계약 시 5% · 귀속	계약 시 5% · 귀속
조합의 해지 문턱	계약금액의 10%	계약금액의 5%	계약금액의 10%	계약금액의 10%
조합 임원 연대보증	도급계약상 채무로 한정	제반 일체의 채무	도급계약상 채무로 한정	도급계약상 채무로 한정

· 당초 조합원 개인 책임에 관하여 존재했던 DL안의 책임부담 규정이 삭제됨으로써 책임·위험 항목은 DL안과 GS안이 사실상 대등해짐.

VI



마감재 비교

[VI. 마감재 비교]

1. 마감재는 도급계약서 본문이 아니라 첨부 리스트로 정해짐

제8조 제2항 (공사계약금액) — 네 안 공통		제26조 제1항 (공사 마감 기준) — 네 안 공통		
"제1항의 공사대금은 첨부된 마감자재를 기준으로 한다. 단, '갑' 및 '갑'의 조합원이 그 마감자재를 상회하는 품질을 요구할 경우 제1항의 공사계약금액과는 별도로, 이에 대한 공사대금의 조정은 '갑'과 '을'이 협의하여 결정한다."		"'을'의 공사기준은 ... 인가된 사업시행인가도서에 의한다. 마감재는 '을'이 제출한 사업참여 제안서(또는 '을'이 별도 제출하는 마감재 리스트)상의 마감 수준을 기준으로 한다."		
구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
마감재 리스트	없음 (시공사 제출에 위임)	제출본에 구체적 자재·규격 미기재	주요 마감재 리스트 (2026. 8., 14개 항목)	마감재 리스트 (2026. 3., 4면)
기재 방식	—	"강마루", "엔지니어드 스톤" 등 품목명 수준	"LG 또는 삼성 급", "이건 또는 LX 또는 현대L&C 급 " 등 등급 표현	브랜드·모델명·규격까지 특정 (예: LG OLED 8K 77" OLED77B4F)
계약 편입	별첨서류 '나. 마감재리스트'	별첨서류에 포함	별첨서류 '나. 마감재리스트'	별첨서류 '나. 마감재리스트'

- 마감재 리스트는 계약서의 일부(별첨)이며, 공사대금 산정의 기준임. 리스트가 구체적일수록 비교가 용이하여 조합에 유리함.
- 마감재는 시공자가 제출한 리스트끼리 비교함.
- 문제점 : DL안 마감재 리스트의 등급 표현("○○ 급")은 시공 단계에서 다툼의 소지가 있고, 정확한 비교를 위하여 품목·규격·모델을 특정할 필요가 있음.

[VI. 마감재 비교]

2. 세대 내부 주요 마감재 비교

항목	DL안 (변경 전) 리미티드 에디션 2026. 1.	DL안 (변경 후) 2026. 8.	GS안 입찰 2026. 3.
창호	유리난간 매입형	유리 난간 매입형 창호, 시스템창호 (LX 또는 현대L&C 또는 이견창호 급)	LX하우시스 론첼 W350 + 유리난간 (거실·안방 외 S5)
거실 마루	강마루	광폭 강마루 (이건 또는 LX 또는 현대L&C 급)	원목마루 (이탈리아 조르다노·가를벨로토 급)
주방 벽체·상판	엔지니어드 스톤 (프리미엄 급)	프리미엄 엔지니어드스톤 (롯데케미칼 또는 LX 또는 현대L&C 급)	이탈리아산 세라믹 타일 (에밀 급)
거실 아트월	기재 없음	고품격 아트월	이탈리아산 세라믹 타일 (에밀 급)
주방가구	외산 하이브리드	외산 하이브리드 (도어 : 푸트라 또는 인타그리/3B[이탈리아]/ 바다: 리바트 또는 한샘 급)	독일 해커 급, 이탈리아 페발까사 급
현관 중문	기재 없음	중문 (LX 또는 현대L&C 급)	3연동 리니어 자동 중문 (LX하우시스 론첼 ID500)
시스템 에어컨	4개소	전실(4개소) (LG 또는 삼성 급)	전실(LG, 84㎡ 이상 세대 주방 포함)
냉장고·김치냉장고	LG 오브제 616L·324L	LG 오브제 또는 삼성 급 616L·324L	LG 오브제 컨버터블 패키지 수준
세탁·건조	워시콤보 25kg	워시콤보 25kg (LG 또는 삼성 급)	LG 오브제 WL22EMZU 수준 (세탁 25kg, 건조 22kg)
식기세척기	14인용	14인용 (LG 또는 삼성 급)	LG 오브제 DUE6GLE 수준 (14인용, 스팀·열풍건조)
스타일러	기재 없음	LG 또는 삼성 급 (추가)	LG 오브제 SC5MBR43 수준
공기청정기 · 정수기	기재 없음	공기청정기만 적용 (정수기 미적용)	LG 오브제 AS356NGMA · WD720RH 수준
TV	75인치	UHD LED 75" (LG 또는 삼성 급)	LG OLED 8K 77" OLED77B4F 수준
위생기구	기재 없음	일반 세면기, 절수 양변기 (비데 1개)	대림바스 급 수전·세면기, 비데일체형 양변기 (보보 급)
친환경 도료 · 전동 그릴창	기재 없음	미적용	적용 (전동 그릴창 DS시스템 Ari-in 수준)

[VI. 마감재 비교]

3. DL안 마감재는 2026. 1. 대비 2026. 8. 개선되었으나 구체적 품목, 규격이 없이 등급제안으로 비교 불가

■ 주요 마감재 리스트_DL이앤씨

구분	리미티드 에디션 제안 ('26. 1월)	현재 ('26. 8월)
주방가구	외산 하이브리드	외산 하이브리드 - 도어 : 푸트라 또는 인타그리 / 3B [이탈리아] - 바디 : 리바트/한샘 급
마루	강마루	광폭 강마루 (이건/LX/현대L&C 급)
창호	유리난간매입형	유리난간매입형 (LX/현대L&C/이건 급)
주방상판	엔지니어드 스톤 (프리미엄 급)	프리미엄 엔지니어드스톤 (롯데케미칼/LX/현대L&C 급)
주방벽체	엔지니어드 스톤 (프리미엄 급)	프리미엄 엔지니어드스톤 (롯데케미칼/LX/현대L&C 급)
시스템에어컨	4개소	전실 (LG 또는 삼성 급)
TV	75인치	75인치 (LG 또는 삼성 급)
냉장고	LG 오브제 (616L)	LG 오브제 또는 삼성 급 (616L)
김치냉장고	LG 오브제 (324L)	LG 오브제 또는 삼성 급 (324L)
전기쿡탑	인덕션 (3구)	인덕션 (3구, LG or 삼성 급)
세탁기	워시콤보 (25KG)	워시콤보 (25KG, LG or 삼성 급)
식기세척기	14인용	14인용 (LG or 삼성 급)
스타일러	-	추가 LG or 삼성 급
공기청정기	-	추가 LG or 삼성 급

- ✓ 상기 변경 마감재('26. 8월) 를 조합원 세대 기본 적용 / 일부 아이템 (주방가구, 마루) 추가 외산 적용 조합 요구 시 도급액 변경 협의
- ✓ 조합원 분양 계약 시 D-Selection (디셀렉션, 플러스 옵션 제도)을 통해 개인별 추가 업그레이드 선택 가능

* 타사업지에서 실제 진행된 디셀렉션 관련 매거진 자료를 송부함. (샘플 자료 참조) 상대원 2구역의 디셀렉션 매거진은 분양 시점에 맞춰 제공될 예정임.



이 정보(문서)는 DL이앤씨의 자산으로서, 허가 없는 사외반출을 금지합니다.

변경 내용

- 시스템에어컨이 기존 4개소에서 전실로 변경되었으나, 일부 자료에는 여전히 '4개소'로 표기되어 있어 확인 및 수정 필요.
- 주방가구·마루·창호·주방상판의 사양이 1월 제안보다 구체화되었으나, 적용 범위와 기준이 여전히 명확하지 않아 향후 마감재 변경을 사유로 공사비 증액 분쟁이 발생할 소지가 있으며, 과다한 증액이 요구되더라도 그 적정성을 확인하기 어려움.
- 스타일러와 공기청정기가 새롭게 추가됨.
- 다만, 구체적인 브랜드와 모델이 아닌 'LG 또는 삼성급', '이건 또는 LX 또는 현대L&C급' 등의 등급 표현으로 기재되어 있어 GS안과의 객관적인 비교가 어렵고, 시공 단계에서 실제 적용 제품을 두고 분쟁이 발생할 수 있음.
- DL안은 주방가구 및 마루에 외산 제품을 추가 적용할 경우 도급금액 변경을 별도로 협의하도록 하는 조건이 부가됨.

[VI. 마감재 비교]

4. DL안과 GS 안 중 비교 시 DL안이 22개 항목 중 17개가 낮은 수준으로 파악됨

마감재	DL이앤씨(변경, 26.08.31)	VS	GS건설(입찰, 26.03)
창호	유리 난간 매입형 창호, 시스템창호 (LX 또는 현대L&C 또는 이견창호 급)	<	LX하우시스 론첼 W350 + 유리난간 (거실·안방 외 S5)
마루	광폭 강마루 (이건 또는 LX 또는 현대L&C 급)	<	원목마루(이탈리아 조르다노 급, 가를벨로또 급)
주방가구	외산 하이브리드 - 도어 : 푸트라 또는 인타그리/3B[이탈리아] - 바디 : 리바트 또는 한샘 급	<	독일 해커 급 이탈리아 페발까사 급
주방 벽	프리미엄 엔지니어드스톤 (롯데케미칼 또는 LX 또는 현대L&C급)	<	이탈리아산 세라믹 타일(에밀 급)
주방 상판	프리미엄 엔지니어드스톤 (롯데케미칼 또는 LX 또는 현대L&C급)	<	이탈리아산 세라믹 타일(에밀 급)
거실 아트월	고품격 아트월	<	이탈리아산 세라믹 타일(에밀 급)
시스템 에어컨	전실(4개소)(LG 또는 삼성 급)	<	전실(LG, 84m' 이상 세대 주방 포함)
침실 붙박이장	침실 1개소	=	침실 1개소
현관 중문	현관중문(LX 또는 현대L&C 급)	<	3연동 리니어 자동 중문 LX하우시스 론첼 ID500
냉장고	오브제 냉장고 616L, 김치냉장고 324L (LG 또는 삼성 급)	=	LG전자 오브제 컨버터블 패키지 수준
TV	TV (75인치) (LG 또는 삼성)	<	LG전자 OLED 8K 77" OLED77B4F 수준
워시타워	워시콤보 25kg (LG 또는 삼성 급)	<	LG전자 오브제 WL22EMZU 수준
광파오븐	LG 또는 삼성 급	=	LG전자 MZ385EBTAD 수준
쿡탑	인덕션 (LG 또는 삼성 급)	=	LG전자 3구 인덕션 BEI3ASB4 수준
식기세척기	14인용 (LG 또는 삼성 급)	<	LG전자 오브제 DUE6GLE 수준
스타일러	LG 또는 삼성 급	<	LG전자 오브제 SC5MBR43 수준
정수기	미적용	<	LG전자 오브제 WD720RH 수준
공기청정기	LG 또는 삼성 급	<	LG전자 오브제 AS356NGMA 수준
세면기	일반	<	대림바스 급
양변기, 비데	절수 양변기 (비데 1개)	<	공용·부부욕실 비데일체형 양변기(비데2개)(보보 급)
친환경 기능성 도료	미적용	<	적용
실외기 전동그릴창	미적용	<	전동 그릴창(DS시스템 Ari-in 수준)

GS 입찰안(2026. 3.) 대비

22개 항목 중 17개 열위

동등 5개 : 침실 붙박이장 · 냉장고류 ·광파오븐 · 쿡탑 ·

[열위 항목의 성격]

- 창호 · 마루 · 주방 벽·상판 · 거실 아트월 · 주방가구
→ 세대 품질을 좌우하는 마감 전반
- 현관 중문 · 세면기 · 양변기 → 사용 빈도가 높은 부위
- 친환경 기능성 도료, 실외기 전동 그릴창, 정수기 → DL안은 미적용

출처: 마감재 항목별 대조표 (DL 변경안 2026. 8. 31. / GS 입찰안 2026. 3.)

6. [참고] DL이앤씨가 8.31에 제출한 마감재 리스트

[illegible]

※ DL이앤씨 제안서는 현재 제작 중이며, 마감재 이미지는 아직 준비되지 않아 본 안내서에는 포함하지 않았습니다. 마감재 이미지는 DL이앤씨 제안서에 별도로 삽입되어 추후 공개될 예정임을 안내드립니다.

6. [참고] GS건설이 입찰 시 제출한 마감재 리스트

■ 상대원2구역 주택재개발정비사업 마감재 리스트

가. 아파트 단위세대(조합원)

실명	품목	적용(안)	비고
현관	바닥	포셀린 타일(유립산)	
	마루골통+절판	엔지니아드스톤 (국산 최상급)	
	벽체	친환경 인테리아시트판넬	
	천정	친환경 실크벽지(국산 최상급)	
거실 및 복도	바닥	원목마루(이탈리아 조르다노 급, 가르벨로도 급)	
	벽체 (아트월 제외 잔여벽)	친환경 인테리아시트판넬	
	천정	친환경 실크벽지(국산 최상급)	
	아트월	이탈리안 세라믹 타일 아트월 (에밀 급)	
주방	주방 벽체	이탈리안 세라믹 타일 주방 벽체 (에밀 급)	
	벽체2	친환경 인테리아시트판넬	
	천정	친환경 실크벽지(국산 최상급)	
덴트리	벽체	친환경 실크벽지(국산 최상급)	
	바닥	현관위치 : 포셀린 타일(유립산) 거실위치 : 원목마루(이탈리아 조르다노 급, 가르벨로도 급)	
	벽체	친환경 실크벽지(국산 최상급)	
안방 드레스룸 전자침실	바닥	상기 거실 마감재 동일	
	벽체	친환경 실크벽지(국산 최상급)	
	천정	친환경 실크벽지(국산 최상급)	
공용욕실 부부욕실	파우더장	PET마감	
	바닥	국산 타일	
	벽체	국산 타일	
	천정	ABS판넬	
다용도실	카운터(벤다이)	엔지니아드스톤	
	바닥	자기질 타일(국산)	
	벽체	무광 수용성 아크릴 페인트	
발코니, 실외기실	바닥	자기질 타일(국산)	
	벽체 / 천정	무광 수용성 아크릴 페인트	
	실외기실바닥	자기질 타일(국산)	
하향식 피난사다리		하향식 피난구	
발코니 확장		조합 전세대 발코니 확장 (비확장 부분 제외)	

실명	품목	적용(안)	비고
주방가구	주방가구 (PH, 키친장포함)	독일 해커 급, 이탈리아 페발까사 급	
	주방가구 (PH외, 키친장포함)	독일 해커 급, 이탈리아 페발까사 급	
	상판 (주방가구 및 아일랜드장)	이탈리아산 세라믹 타일(에밀 급)	
	거실, 안방	창호 LX하우시스 온첼W350창호 + 유리난간	거실 안방 외 S5
창호	욕실문	ABS도어(국산) + 오토셀 (손끼임방지재 포함)	
	현관 중문	3연동 리니어 자동 중문 LX하우시스 온첼 ID500	
	실외기실 루버	전동 그릴창(DS시스템 Ari-in)	
기타	현관도어록	최신형 디지털도어락 (Push - Pull + 지문인식)	
	천정물딩	PVC시트레플물딩	
	결레받이	PVC+친환경시트	
	바닥충격음 차음재	60T	
전자제품 (발트인)	발레 건조대	전동식 발레건조대	
	시스템 에어컨	LG (현실, 84m2 이상 세대 주방 포함)	
	냉매배관	전설 설치	
	냉장고	LG오브제 컴버터블 패키지 수준	X321AA3(냉동 3840)
	냉동고	LG오브제 컴버터블 패키지 수준	Y321AA3(냉동 3210)
	김치 냉장고	LG오브제 컴버터블 패키지 수준	Z321AA3C(김치 3240)
	식기세척기	LG전자 오브제 DUE6GLE 수준, 14인용, 스팀, 열풍건조	
	전기보온	LG전자 MZ385EBTAD 수준	
	연력선	LG전자 연력선 BEI3ASB4 수준	
	원지후드	힘철 디사일런트 후드(저소음 후드)	
전자제품	워시타워 또는 분리형 세탁기 및 건조기	LG전자 오브제 WL22EMZU 수준 (세탁 25kg, 건조 22kg)	
	스타일러	LG전자 오브제 SC5MBR43 수준 (5벌+바지1벌)	
	청수기	LG전자 오브제 WD720RH 수준, 냉온수, 열음	
	공기청정기	LG전자 오브제 AS356NGMA 수준	
	TV	LG전자 OLED 8K 77" OLED77B4F 수준	
	욕조	국산 세라믹	
위생기구 및 수전류	양변기 (공용/부부욕실)	비태일제형 양변기 (보보 급)	
	세면기	대림바스 급	
	세면기수전	대림바스 급	
	샤워욕조수전	대림바스 급	
	샤워수전	대림바스 급	
	주방싱크대 수전	국산 터치식	
	발코니	세탁기용, 청소용(스프레이건 2M)	
	욕실 악세서리	일체 포함	
	위생기구	절수형 적용	

가. 아파트 단위세대(조합원) — 실별 마감

주방가구 · 창호 · 전자제품 · 위생기구

[VI. 마감재 비교]

JIPYONG 법무법인[유] 지평

#별첨. [참고] GS건설이 입찰 시 제출한 마감재 사진#1

글로벌 하이글래스 마감재



창호 L/S 이중창 론첼 350 + 유리난간 (거실 + 안방)

LX하우시스 LONCHEL



발코니 확장 (조합 + 일반 + 임대)

*본 제안서에 사용된 사진, 도면, CO, 양식 등은 물론 제공한상의 자료를 출처로 삼고, 실제 입찰 시 등 사용결과와 차이가 있을 수 있습니다.



47

[VI. 마감재 비교]

JIPYONG 법무법인[유] 지평

#별첨. [참고] GS건설이 입찰 시 제출한 마감재 사진#2

글로벌 하이클래스 마감재



주방가구 해커 급 또는 페발까사 급

Häcker
KITCHEN - GERMAN MADE



48



febalcasa

*본 제안서에 포함된 사진, 도면, CO, 양자측 등은 최종발령의 마감재를 일괄적인 것으로 실제 입찰가 등 서면계약과정에서 다른 변경될 수 있습니다.



49

[VI. 마감재 비교]

JIPYONG 법무법인[유] 지평

#별첨. [참고] GS건설이 입찰 시 제출한 마감재 사진#3

글로벌 하이클래스 마감재



원목마루 조르다노 급 또는 가르벨로또 급 Listone Giordano



GARBELOTTO



거실 아트월 에밀 급 세라믹 타일

EMIL CERAMICA

*본 제안서에 포함된 사진, 도면, CO, 양자소 등 본 포럼발령의 자료를 옮기 위한 것으로 실제 입찰가 등 서면제출자료에서 다른 변경될 수 있습니다.



51

[VI. 마감재 비교]

JIPYONG 법무법인[유] 지평

#별첨. [참고] GS건설이 입찰 시 제출한 마감재 사진#4

글로벌 하이클래스 마감재

하이엔드 라이프 스타일



주방 가구상판 및 주방 벽체 에밀 급 세라믹 타일

EMIL
CERAMICA



시스템 에어컨 (전설)

LG



TV OLED 8K (77인치)

LG

*본 제안서에 사용된 사진, 이미지, CG, 일러스트 등은 GS건설의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 입찰 시 제출된 사진과 다를 수 있습니다.



53

[VI. 마감재 비교]

JIPYONG 법무법인[유] 지평

#별첨. [참고] GS건설이 입찰 시 제출한 마감재 사진#5

하이엔드 라이프 스타일



컨버터블 (냉장, 냉동, 김치냉장고)

LG Objet Collection



워시타워 (세탁, 건조)

LG Objet Collection



스타일러

LG Objet Collection



공기청정기

LG Objet Collection



식기세척기

LG Objet Collection

*본 제안서에 사용된 사진, 이미지, CG, 일러스트 등은 로열티없는 자재를 출처 표기 없이 무단으로 사용될 경우 법적 책임이 발생할 수 있습니다.



55

[VI. 마감재 비교]

JIPYONG 법무법인[유] 지평

#별첨. [참고] GS건설이 입찰 시 제출한 마감재 사진#6

하이엔드 라이프 스타일



정수기

LG Objet Collection



현관중문 (자동 3연동 슬라이딩도어)

LX하우시스



세면기 / 수전 대림바스 급



비데일체 양변기 보보 급 (공용, 부부욕실)



인덕션 (3구)

LG



전기오븐

LG



불박이장 (침실 1개소)



디지털 도어록 (Push & Pull + 지문인식)

*본 제안서에 사용된 사진, 이미지, CO, 일러스트 등은 제공업체의 자료를 옮기 위한 것으로 실제 입찰가 등 사업결과에 따라 다를 수 있습니다.




57

#별첨. GS건설이 입찰 시 제출한 커뮤니티 특화 사진#1

특별함을
더하다

3

브랜드 파트너십
커뮤니티 특화



에브리드경제

**“여보 오늘은 전복술밥이래”
오픈런까지 등장한 아파트 식당**

입주민 9,000원에 한식·중식·양식 등 선택

호텔식 조식서비스가 고급 아파트의 상징이 되면서 이들도 일하는 신축 단지가 늘어나고 있는 가운데, 한미 9000원에 제공되는 중식 서비스와 입주민들의 오픈런까지 열려난 강남 아파트 단지가 새로운 시장이 열린다. 대체로 입주민들의 호응이 유례없는 가격 때문이다. 입주민 대부분이 이용 비용 등과 관련한 불만도 나오는 상황이다.

9월 부동산 업계에 따르면 올해 2월 말부터 입주한 서울 강남구 계동동 제로차이브레지언스는 지난 7월부터 단지 내 식당에서 중식 서비스를 운영하기 시작했다. 중식은 오전 11시~오후 2시, 약식은 오후 5시~8시 30분까지 매일 각 4000원, 주말 각 5000원으로 세탄하는데 조식 서비스도 후후 제공될 예정이다.

X1
마스터어자이

교보문고 큐레이팅 도서관 LIBRO Curated by KYOBO 교보문고	엘리시안 식사 서비스 ELYSIAN	OCS 체험형 커피 문화공간 OCS H. JARIS CROSSBANT
째깍악어 돌봄서비스 Zhang Yakuo	솔닥 비대면 의료서비스 soldoc	GDR + 골프퍼팅 시뮬레이터 TOURPUTT

*본 책에서 사용된 사진, 차트, CG, 일러스트 등은 저작권자의 허락을 얻지 않은 것으로 실제 단지가 등 사용된 형태와 다를 수 있습니다.



[VI. 마감재 비교]

JIPYONG 법무법인[유] 지평

#별첨. GS건설이 입찰 시 제출한 커뮤니티 특화 사진#2


COMMUNITY DESIGN

대원초등학교를 품은 단지

독서, 배움, 놀이가 이어지는 교육 특화 프로그램

교육특화 커뮤니티를 강화하기 위해 교보문고 협업 라이브러리 라운지와
패각악어 돌봄센터까지 단지 내 교육 프로그램의 전문성을 높였으며,
독서실, 프라이빗 스튜디오 등도 갖추었습니다.

놀이와 배움이 있는 돌봄센터
패각악어

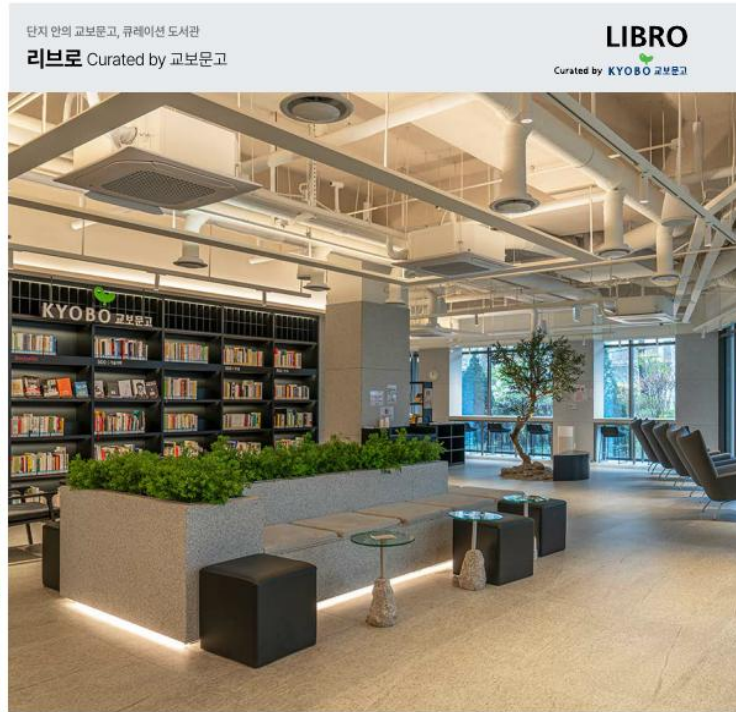

일상의 품격을 높이는 단지

다이닝, 의료, 스포츠가 어우러진 프리미엄 라이프 프로그램

단지 안에서 완성되는 고품격 라이프를 위해 프리미엄 식사 서비스와
비대면 메디컬 케어, 브랜드 카페와 체험형 스포츠 프로그램까지 갖추었습니다.

비대면 진료 온라인 처방
솔닥



고급 리조트의 올데이 식사 서비스
엘리시안



체험형 커피 문화공간
OCS by 파리크라상



GDR + 골프퍼팅 시뮬레이터
투어펫



*본 제안서의 사용된 사진, 이미지, CG, 일러스트 등은 표절행위와 사생활 등 기타 관련 2020년 1월 1일부터 시행된 개인정보 보호법 제23조 제2항에 따라 변경될 수 있습니다.

[VI. 마감재 비교]

JIPYONG 법무법인[유] 지평

#별첨. GS건설이 입찰 시 제출한 커뮤니티 특화 사진#3


COMMUNITY DESIGN

LIFE & CULTURE ZONE

드라이브스루 카페

DRIVE-THROUGH CAFE

단지의 동선 위에 설계된 프리미엄 커피 서비스로
이동의 순간까지 품격을 더하는
하이엔드 드라이브스루 카페입니다.




130



비대면 의료서비스

HEALTHCARE CENTER

일상 속에서 건강을 품격 있게 관리하는
비대면 진료 시스템으로 안심을 더하는 헬스케어 공간입니다.



상무센트럴타워 사례



*본 책안사에 사용된 사진, 이미지, CG, 일러스트 등은 저작권자의 허락을 얻지 못한 것으로 실체 인격권 등 사익침해의 우려가 있는 것으로 판단됩니다.

131

[VI. 마감재 비교]

JIPYONG 법무법인[유] 지평

#별첨. GS건설이 입찰 시 제출한 조경 사진




[VI. 마감재 비교]

#별첨. 문주 비교

JIPYONG 법무법인[유] 지평

DL이앤씨 문주

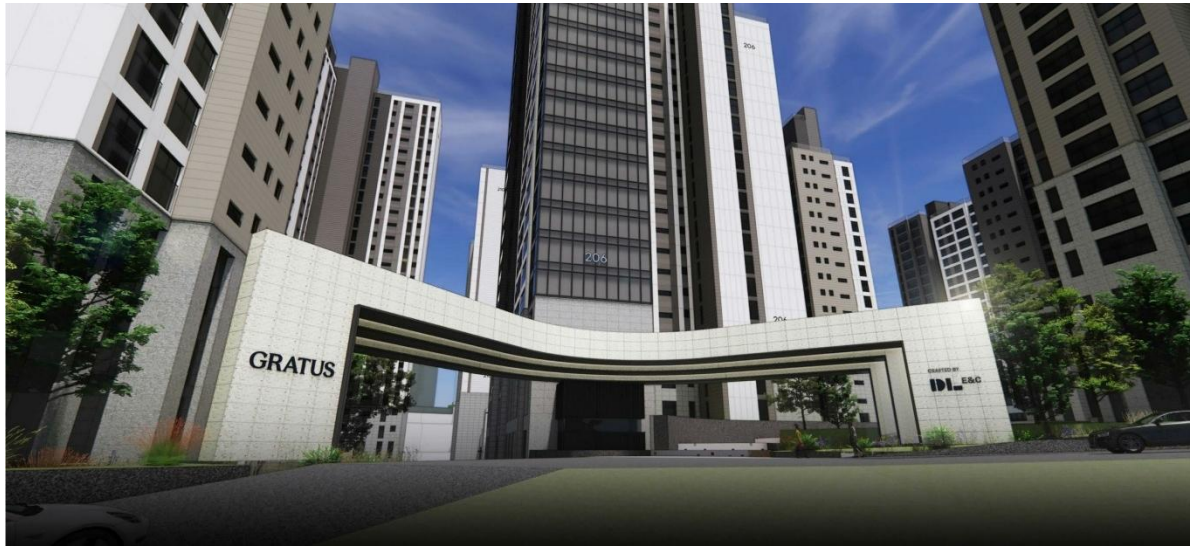

GS건설 문주



출처: DL 리미티드 에디션 2026. 1. / GS 입찰안 2026. 3.

[VI. 마감재 비교]

7. 인근 정비사업장과 비교

사업장	시공사	평단가	마루	주방가구	주방상판 · 벽체
과천 5단지	대우건설·GS건설	767만 원	수입 원목마루	수입가구	수입 세라믹
과천 8·9단지	현대건설	764만 원	수입 원목마루	수입가구	칸스톤 (프리미엄급)
분당 무지개마을4단지	포스코이앤씨	758만 원	수입마루	수입가구	수입 세라믹
성남 은행주공	포스코이앤씨	698만 원	수입마루	수입가구	수입 세라믹
산성역 헤리스톤	대우건설·GS건설	629만 원	국내산 강마루	수입가구	엔지니어드스톤
성남 신흥2구역	GS건설·대우건설	500만 원	국내산 강마루	국내산 가구	엔지니어드스톤
상대원2구역 — DL 제안	DL이앤씨	699만 원 (또는 682만 원)	국내산 광폭 강마루 (이건 또는 LX 또는 현대L&C 급)	국내산 가구 (도어 수입: 푸트라·인타그리)	엔지니어드스톤
상대원2구역 — GS 제안	GS건설	729만 원	수입 원목마루 (조르다노·가를벨로또 급)	수입가구 (해커·페발까사 급)	수입 세라믹 타일 (이탈리아산 에밀 급)

- 평단가 700만 원대의 인근 사업장은 대부분 수입 원목마루·수입가구·수입 세라믹을 적용하고 있음.
- DL안(699만 원)의 마감 수준은 평단가 500만~630만 원대 사업장과 유사하다고 보임.
- DL안 적용시 단가 대비 마감 수준의 상향 협의가 필요함.

[VI. 마감재 비교]

8. 소결 — 마감재는 계약조건과 달리 아직 격차가 남아 있음

항목	DL안 (변경 전) 리미티드 에디션 2026. 1.	DL안 (변경 후) 2026. 8.	GS안 입찰 2026. 3.
리스트의 구체성	품목명 수준	14개 항목 등급 표현	실별·품목별 브랜드·모델 특정
항목별 수준	—	22개 항목 중 17개에서 열위 (동등 5개)	22개 항목 중 17개에서 상위
특화분의 금액 환산	별도 산출 없음	별도 산출 없음	평당 약 85만 원 (총 2,250억 원)
추가 상향의 경로	—	주방가구·마루 등 외산 적용 요구 시 도금액 변경 협의 (DL 제안서 기재)	입찰 제안 내용이 계약에 편입
개인별 업그레이드	—	조합원 분양계약 시 D-Selection 선택 가능 (개인 부담)	규정 없음

- 계약조건은 조합배포안 수준으로 정리되었으나, 마감재는 여전히 GS 입찰안이 우위에 있음.
 - DL안의 마감재 상향은 "도금액 변경 협의" 사항으로 열려 있으므로, 상향 시 공사비가 함께 오를 수 있음.
 - 향후 ① 마감재 리스트의 품목·규격·모델 특정, ② 상향 항목과 그에 따른 도금액 변경 범위의 사전 확정이 필요함,
 - 또한 ③ 마감재 리스트를 계약서 별첨으로 확정하고 변경 시 조합 동의를 요건으로 하는 문언의 추가 필요함.

VII

종합 평가와 남은 과제

[Ⅶ. 종합 평가와 남은 과제]

1. 계약조건의 격차는 대부분 조정됨

구분	조합배포안	DL안 (변경 전) 2025. 11.	DL안 (변경 후) 2026. 8. 25.	GS안 2026. 3.
공사비와 물가변동	기준	GS안 우세	명목 단가는 DL안, 증액 위험은 대등	기준과 같음
사업비 조달과 금융조건	기준	GS안 우세	재원의 크기는 DL안, 조건은 대등	기준과 같음
조합·조합원의 책임과 위험	기준	GS안 우세	사실상 대등	기준과 같음
공사 범위·일정·분양·품질	기준	GS안 우세	사실상 대등	기준과 같음
마감재	리스트 없음	구체적 기재 부족	GS안 대비 열위 (22개 중 17개)	마감재 우위 · 특화 반영 (평균 약 85만 원)

- DL이 조합배포안을 수용하면서 대부분 계약 문언 자체가 바뀌면서 계약조건의 격차는 대부분 사라짐.
 - 구체적으로는 조합원 직접 추심·사전구상권·공정증서·공사이익 배상 조항의 삭제, 공사비 증액 사유 10개에서 4개로 축소, 공기 연장 사유 15개에서 6개로 축소, 물가지수의 변경, 계약이행보증 5%의 확보로 변경 전보다 조합에 유리한 환경 조성됨.
 - 현재 남은 실질적 쟁점은 ① 공사비 산정의 전제(기준월·연면적·옹벽공사·철거공사비 산출내역서 보완)와 ② 마감재 수준 두 가지로 좁혀졌다고 보임.

2. 남은 쟁점: 공사비 산정의 전제와 마감재

쟁점	현재 상태 (DL안 변경 후)	조합의 협상 방향
공사비 산정 기준월	699만 원(2026. 12.) 또는 682만 원(2026. 6.) 선택 (현재 시점에서는 2026. 12. 기준으로 판단)	2026. 6.은 이미 경과. 2026. 12. 기준으로 확정하여 실착공까지의 조정 기간을 줄일 것
연면적 기준	사업시행인가 신청 기준 (GS안은 사업시행인가 기준)	사업시행인가 기준으로 통일
사업부지 면적 · 옹벽공사	1~3호 패널 옹벽 설치가 조합 부담 (제6조 제3항 제15호)	옹벽공사 비용을 산출하여 도급액에 포함시키거나 공사비 비교 시 반영
마감재 리스트	14개 항목 등급 표현 ("○○ 급")	품목·규격·모델 특정, 상향 항목과 도급액 변경 범위의 사전 확정, 별첨 확정 및 변경 시 조합 동의 요건화
조합의 해지 문턱	지체상금이 계약금액의 10%에 도달할 것	당초 DL안(5%)보다 높아진 점을 감안하여 유지 여부 검토
사업촉진비 대여조건	"별도로 정하는 대여조건"에 위임	이자율·상환시기 등 조건을 계약 체결 전 서면 확정
발코니 확장 부가가치세	조합배포안의 "준공 시 청구" 문구가 삭제됨	청구 시기를 조합배포안대로 복원할지 확인

- 위 8개 사항은 모두 계약서 문언과 별첨으로 정리해야 하는 사항임.
- 계약 체결 전에 정리하지 않으면, 착공 이후 공사비 증액과 품질 분쟁의 형태로 발생가능.

감사합니다.

JIPYONG 법무법인[유] 지평
